



การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564-2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วันที่ 31 มีนาคม 2565

งบลงทุน 2565

ครุภัณฑ์

39 รายการ

วงเงิน

16,262,000 บาท

สิ่งก่อสร้าง

3 รายการ

วงเงิน

6,107,000 บาท

วงเงินรวม 22,369,000 บาท

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 30 มีนาคม 2565



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Public Health Office

ลำดับ	ขั้นตอน	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวมครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง		
		จำนวน (รายการ)	วงเงิน(บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน(บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน(บาท)	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายแล้ว	38	15,106,263	1	269,594	39	15,375,857	68.74
2	ลงนามสัญญาแล้ว/รอส่งของ/รอเบิกจ่าย	1	925,000	2	5,563,406	3	6,488,406	29.01
3	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
4	ยังไม่ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	เหลือจากก่อนนี้(แจ้งคืน สป.แล้ว)	-	230,737	-	274,000	-	504,737	2.26
รวม		39	16,262,000	3	6,107,000	42	22,369,000	100.00

รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย

ครุภัณฑ์ 1 รายการ

1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดสี 2 หัวตรวจ

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 1 เครื่อง

- วงเงิน 925,000 บาท
- ส่งมอบของ 31 มี.ค. 2565

สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ

1. อาคารแพทย์แผนไทย 1 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วงเงิน 994,000 บาท

- การดำเนินงานตามงวดงาน : งวดที่ 1-2/3 งวด
- นัดส่งมอบงวด 1-2 : วันที่ 7 เม.ย.65
- สิ้นสุดสัญญา : วันที่ 18 ก.ค.65

2. อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 290 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดสำราญ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

- การดำเนินงานตามงวดงาน : งวดที่ 1/4 งวด
- สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย.2565

อาคารแพทย์แผนไทย 1 ชั้น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง

งบประมาณ 999,000 บาท

วงเงินตามสัญญา/PO 994,000 บาท

สัญญาเลขที่ 1/2565 ลว.19 ม.ค. 65

- หจก.กายพีชร์
- อำนาจ นายอำเภอ

สิ้นสุดสัญญา 18 กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนปัจจุบัน ดำเนินการงวดที่ 2-3/3

กำหนดส่งมอบงวดที่ 1-2 วันที่ 7 เม.ย.65

- ส่งมอบงวด 1 20 มี.ค.65
- ส่งมอบงวด 2 19 พ.ค.65
- ส่งมอบงวด 3 (งวดสุดท้าย)
18 ก.ค.65

อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตารางเมตร
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณ 4,340,000 บาท

วงเงินตามสัญญา/PO 4,200,000 บาท

สัญญาเลขที่ 90/2565 ลว.20 ธ.ค.64

- หจก.เมฆศรีรุ่ง การช่าง
- อำนาจรองผู้ว่าราชการจังหวัด


สิ้นสุดสัญญา 5 กันยายน 2565

ขั้นตอนปัจจุบัน ดำเนินการงวดที่ 1/4

- ส่งมอบงวด 1 20 มี.ค.65
- ส่งมอบงวด 2 9 พ.ค.65
- ส่งมอบงวด 3 28 มิ.ย. 65
- ส่งมอบงวด 4 (งวดสุดท้าย)
5 ก.ย. 65

ภาพรวมผลการดำเนินงานงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565

■ เบิกจ่ายแล้ว ■ ลงนามสัญญาแล้ว ■ เหลือจากก่อนนี้

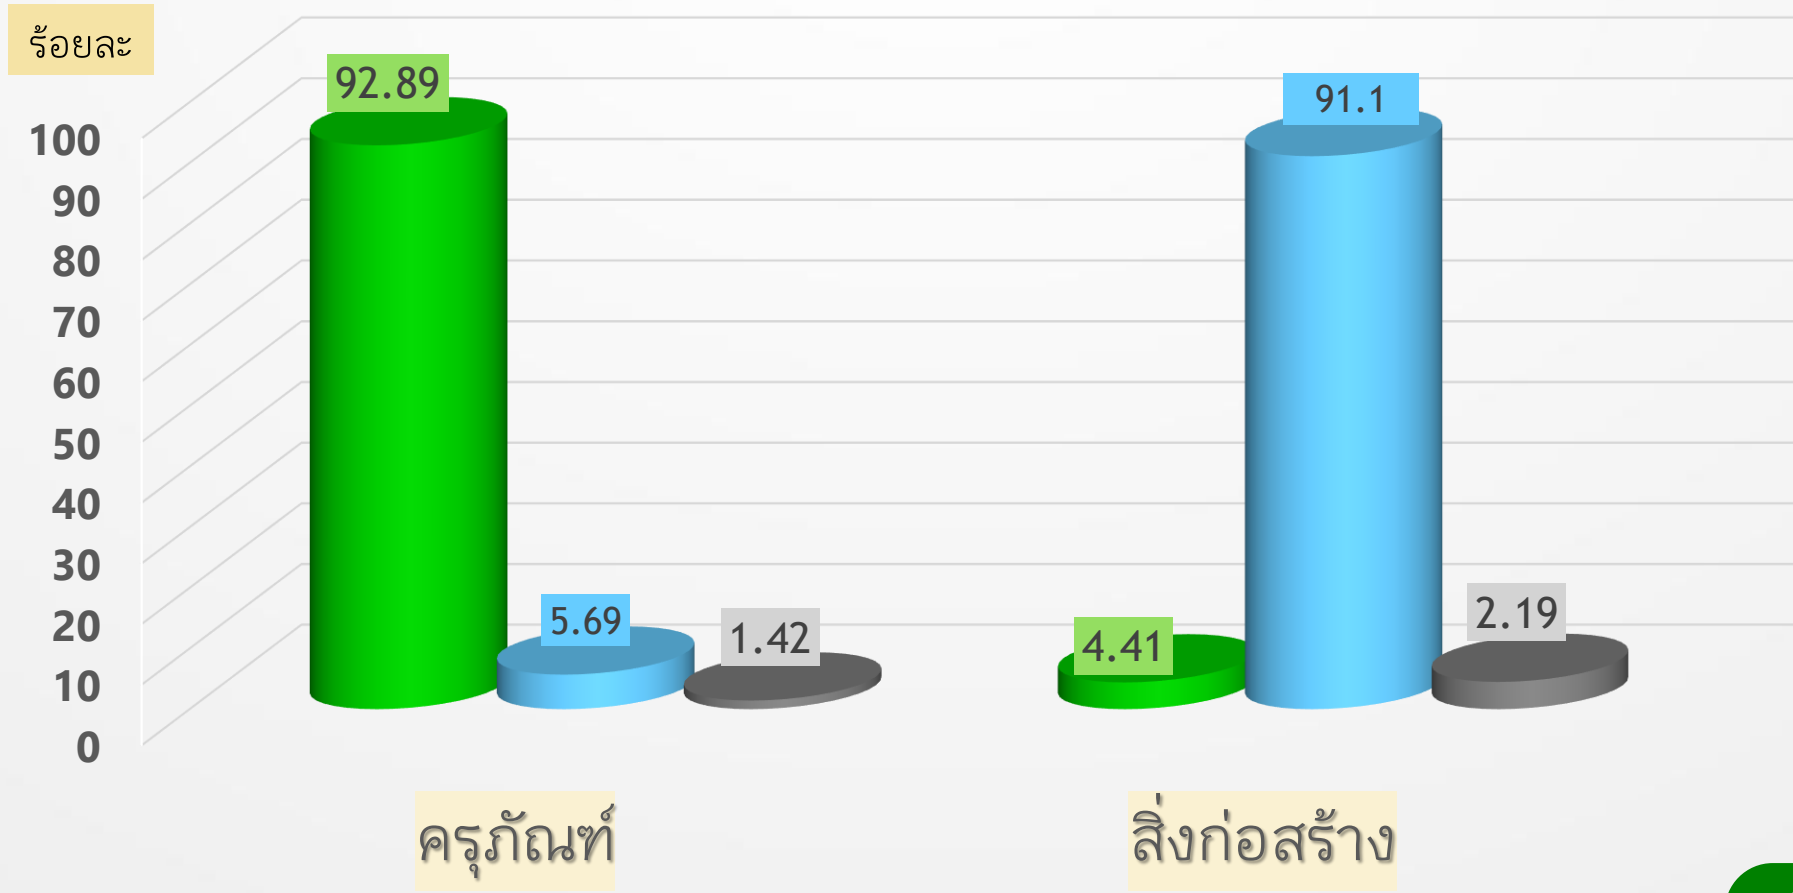


วันที่ 30 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินงานแยกรายหน่วยงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2565



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
Yang Province of Public Health Office

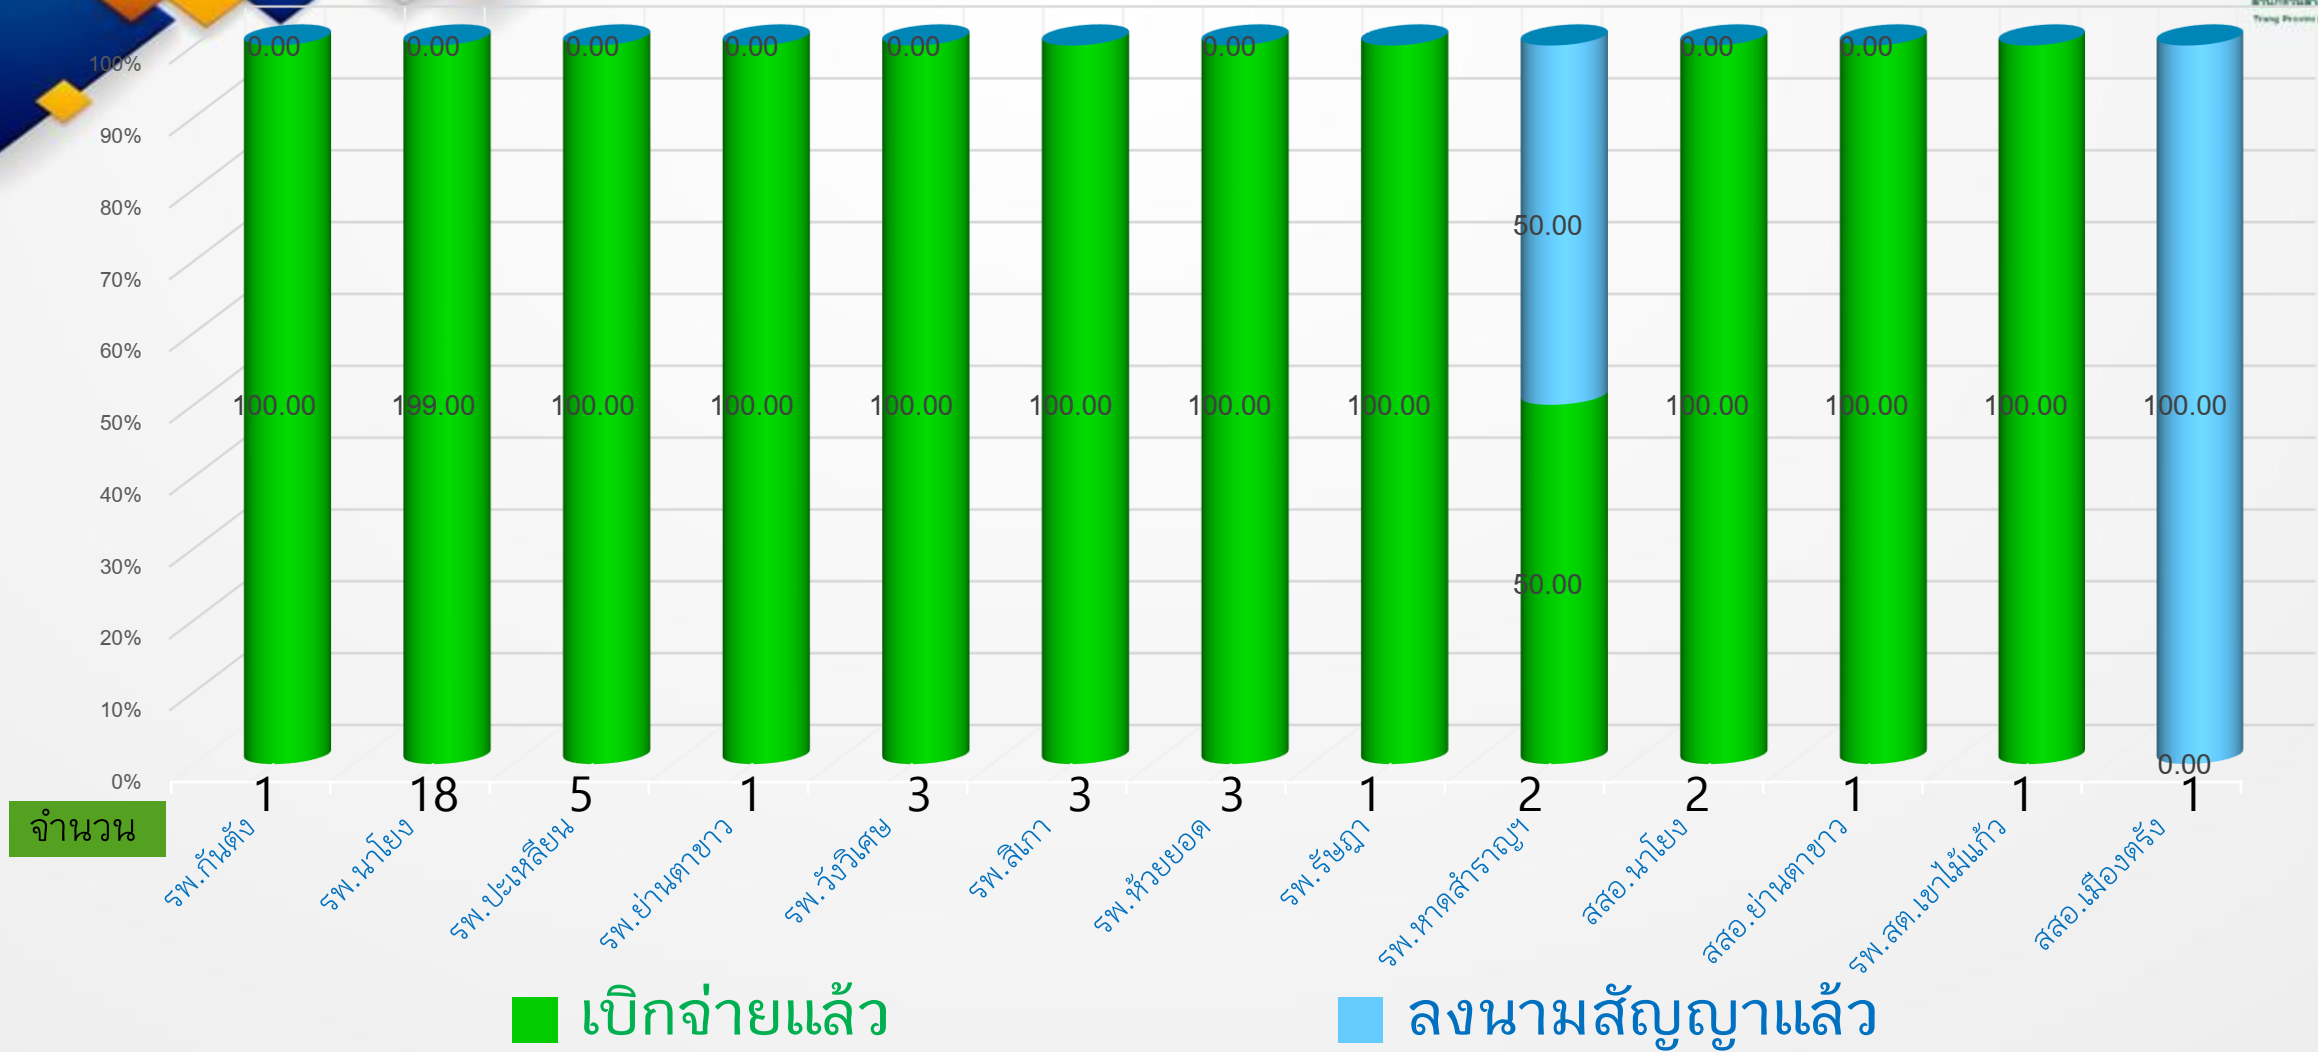

งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ COVID-19

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

วงเงินรับจัดสรรของจังหวัดศรีสะเกษ

ครุภัณฑ์ 63 หน่วย
วงเงิน 36,389,000 บาท

รพศ.ศรีสะเกษ 5 รายการ/16 หน่วย
วงเงิน 12,566,100 บาท

รพช. 5 รายการ/47 หน่วย
วงเงิน 23,822,900 บาท

ครุภัณฑ์ รพช. 5 รายการ/47 หน่วย วงเงิน **23,822,900** บาท

01

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

ราคา 990,000 บาท/หน่วย รวม 6 เครื่อง *วงเงินรวม 5,940,000 บาท*

02

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

ราคา 449,700 บาท/หน่วย รวม 1 เครื่อง *วงเงินรวม 449,700 บาท*

03

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์
ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

ราคา 1,993,200 บาท/หน่วย รวม 6 เครื่อง *วงเงินรวม 11,959,200 บาท*

04

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก

ราคา 149,000 บาท/หน่วย รวม 26 เครื่อง *วงเงินรวม 3,874,000 บาท*

05

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ราคา 200,000 บาท/หน่วย รวม 8 เครื่อง *วงเงินรวม 1,600,000 บาท*

สสจ.ตรัง ดำเนินการ
โดยวิธี E-bidding

ขั้นตอนปัจจุบัน

- ประกาศเชิญชวน
28 มี.ค.- 1 เม.ย. 65
- เสนอราคา
4 เม.ย. 65
- พิจารณาผล
5 เม.ย. 65



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
Trang Provincial Public Health Office

ความก้าวหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

ความก้าวหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	สถานที่	วงเงินตามสัญญา/PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สิ้นสุดสัญญา	รายละเอียดขั้นตอนปัจจุบัน	วันคาดการณ์แล้วเสร็จ
1	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	รพ.รัชฎา	7,056,000.00	776,160.00	6,279,840.00	17 เม.ย.65	- เบิก 2/6 งวด - ส่งมอบงวด 3/6 23 มี.ค.65 - งวดที่ 4- 6/6	ปรับแผน 31 พค.65
2	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	รพ.กันตัง	6,695,228.36	2,747,000.00	3,948,228.36	16 ก.พ.65	- เบิกจ่ายแล้ว 4/6 งวด - เสร็จ/กก.ไม่ตรวจรับ/แก้ไข	
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	รพ.ห้วยยอด	11,170,000.00	5,585,000.00	5,585,000.00	15 มิ.ย.65	- เบิก 4/8 งวด - ดำเนินการ งวด 5-6	15 มิ.ย.65
4	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร วงเงิน 140,000,000 บาท - ปีงบประมาณ 2564 29,909,000 บาท - ปีงบประมาณ 2565 26,171,000 บาท - ปีงบประมาณ 2566-2567 83,920,000 บาท	รพ.ห้วยยอด	29,909,000.00	-	29,909,000.00	9-มี.ค.-67	ดำเนินการงวด 1/16 งวด	9-มี.ค.-67
5	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,800 ตรม. วงเงิน 52,146,600 บาท - ปีงบประมาณ 2563 8,233,800 บาท (งบพับ) - ปีงบประมาณ 2564 43,812,800 บาท	รพ.ห้วยยอด	30,107,400.00	-	30,107,400.00	10 ส.ค.65	- การดำเนินงานอยู่ในการก่อสร้าง งวดที่ 1/7 งวด - ผู้รับจ้างส่งแผนเบิกจ่าย	ปรับแผน 20 มค.66
รวม			84,937,628.36	9,108,160.00	75,829,468.36			

ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลห้วยยอด

- หมายเหตุ ลำช้า 2 งวดงาน
- ส่งมอบงวด 3 22 พ.ย. 64
 - ส่งมอบงวด 4 1 ม.ค. 65
 - ส่งมอบงวด 5 31ม.ค. 65
 - ส่งมอบงวด 6 22 มี.ค. 65
 - ส่งมอบงวด 7 1 พ.ค. 65
 - ส่งมอบงวด 8 15 มิ.ย. 65

งบประมาณ 12,850,900 บาท

วงเงินตามสัญญา/PO 11,170,000 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด

- งวด 1 = 1,117, 000 บาท
- งวด 2 = 1,675,500 บาท

สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนปัจจุบัน เบิกแล้ว 4/8 งวด
ดำเนินการงวดที่ 5-6

อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร วงเงิน 140,000,000 บาท

โรงพยาบาลห้วยยอด



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
Trang Provincial Public Health Office

งบประมาณ

- ▶ ปีงบประมาณ 2564
29,909,000 บาท
- ▶ ปีงบประมาณ 2565
26,171,000 บาท
- ▶ ปีงบประมาณ 2566-2567
83,920,000 บาท

งบประมาณ 140,000,000 บาท

วงเงินตามสัญญา/PO 140,000,000 บาท

ลงนามแล้ว 29 ธ.ค.64 (16 งวด)

ขั้นตอนปัจจุบัน ดำเนินการงวดที่ 1/16

เริ่มสัญญา 31 ธ.ค. 64

สิ้นสุดสัญญา 9 มี.ค. 67

อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 1,800 ตร.ม. วงเงิน 52,146,600 บาท

โรงพยาบาลห้วยยอด



หมายเหตุ ลำช้า 4 งวดงาน

- ส่งมอบงวด 1 6 มิ.ย.64
- ส่งมอบงวด 2 10 ส.ค.64
- ส่งมอบงวด 3 19 ต.ค.64
- ส่งมอบงวด 4 23 ธ.ค.64
- ส่งมอบงวด 5 26 ก.พ.65
- ส่งมอบงวด 6 6 มิ.ย.65
- ส่งมอบงวด 7 10 ส.ค. 65

■ งบประมาณตามสัญญา 38,341,200 บาท
■ **งบพัับ** 8,233,800 บาท

วงเงินคงเหลือ/PO 30,107,400 บาท

ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1/7

สิ้นสุดสัญญา **10 สิงหาคม 2565**

ปีงบประมาณ 2563 = 8,233,800 บาท (งบพัับ)

ปีงบประมาณ 2564 = 43,912,800 บาท

อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลรัชฎา

หมายเหตุ ลำช้า 2 งวดงาน

- ส่งมอบงวด 1 9 ก.ย.64
- ส่งมอบงวด 2 9 ต.ค.64
- ส่งมอบงวด 3 14 พ.ย.64
- ส่งมอบงวด 4 28 ธ.ค.64
- ส่งมอบงวด 5 16 ก.พ.65
- ส่งมอบงวด 6 17 เม.ย.65

01 งบประมาณ 8,041,400 บาท
วงเงินตามสัญญา/PO 7,056,000 บาท

02 เบิกจ่าย 2,747,000 บาท
สิ้นสุดสัญญา **25 เม.ย. 2565**

03 ขั้นตอนปัจจุบัน
เบิก 2/6 งวด
ส่งมอบงวดที่ 3
งวดที่4-6 ส่งมอบ พ.ค.65
คาดการณ์วันแล้วเสร็จ 31 พ.ค.65

อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันตัง



01 งบประมาณ 8,041,400 บาท
วงเงินตามสัญญา/PO 6,700,000 บาท

02 เบิกจ่าย 2,747,000 บาท
สิ้นสุดสัญญา **16 กุมภาพันธ์ 2565**

03 ขั้นตอนปัจจุบัน
เบิก 4/6 งวด
กรรมการไม่ตรวจรับ/แก้ไขงาน

04 หมายเหตุ ล่าช้า 1 งวดงาน
➤ ส่งมอบงวด 5 18 ธ.ค.64
➤ ส่งมอบงวด 6 16 ก.พ.65

การติดตามกำกับ

“ทำสงครามกับ
งบลงทุน”

ระดับเขต

- ประชุมติดตามทุกเดือน ผ่านระบบ Zoom
- สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามช่วงเดือน เมษายน 2565

ระดับจังหวัด

- ประชุมติดตามผ่านระบบ Zoom วันที่ 5 เมษายน 2565
- รอง นพ.สสจ. ลงพื้นที่ติดตาม รพ.ห้วยยอด วันที่ 4 เมษายน 2565



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
Sri Saket Provincial Public Health Office

ขอขอบคุณค่ะ
